



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Rua Guilherme Schiffer, 67 – Fone/Fax (42) 3256-1122
CEP 84.140-000 Porto Amazonas – PR
E-mail: prefpamazonas@uol.com.br



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: PORTO AMAZONAS/PR

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: **PORTO AMAZONAS** CNPJ: **76.179.837/0001-01**
Endereço: **RUA GUILHERME SCHIFFER, 67 - CENTRO**
UF: **PR** CEP: **84.140-000** Telefone: **(42) 3256-1122**
Conta Corrente: **001 BANCO DO BRASIL** Agência: **PALMEIRA** Praça de Pagamento:
nº **001 BANCO DO BRASIL** CPF: **150.279.969-34**
Responsável: **ADEMIR SCHÜHLI**
CI/Órgão Expedidor: **737.461/SSP** Cargo: **CHEFE DO PODER EXECUTIVO** Função: **PREFEITO MUNICIPAL**

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome: _____ CPF ou CNPJ: _____

Endereço: _____ CEP: _____

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4 (quatro) quilômetros e 24.000,00 (vinte e quatro mil) m², nos trechos Morro do Cristo (ext.: 1.100,00m, larg.: 6,00m, área a ser


José Brasílio Scheremeta Lins
Engenheiro Civil
CREA PR - 89139/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Rua Guilherme Schiffer, 67 – Fone/Fax (42) 3256-1122
CEP 84.140-000 Porto Amazonas – PR
E-mail: prefpamazonas@uol.com.br



pavimentada: 6.600,00m²), Porto Velho (ext.: 600,00m, larg.: 6,00m, área a ser pavimentada: 3.600,00m²), Castelhanos de Fora (ext.: 1.200,00m, larg.: 6,00m, área a ser pavimentada: 7.200,00m²) e Restinga Seca (ext.: 1.100,00m, larg.: 6,00m, área a ser pavimentada: 6.600,00m²).

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	MORRO DO CRISTO	UTM:22J0581503 - 7226103	UTM:22J0610938 - 7172811	1,10	6,00	6.600,00
2	PORTO VELHO	UTM:22J0608114 - 7174179	UTM:22J0608527 - 7174193	0,60	6,00	3.600,00
3	CASTELHANOS DE FORA	UTM:22J0608523 - 7174189	UTM:22J0605760 - 7171647	1,20	6,00	7.200,00
4	RESTINGA SECA	UTM:22J0611519 - 7179170	UTM:22J0612511 - 7179393	1,10	6,00	6.600,00
TOTALIZAÇÃO				4,00	6,00	24.000,00

4. JUSTIFICATIVA

A pavimentação poliédrica das estradas rurais com pedras irregulares, nos trechos acima descritos, mostra-se uma solução viável do ponto de vista econômico, além de proporcionar boa trafegabilidade, nas diversas condições climáticas. O município de Porto Amazonas conta com uma malha de estradas rurais de aproximadamente 110,00 quilômetros, cuja manutenção é efetuada pelo departamento de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, que conta com equipamentos insuficientes e avariados. Por isso, o auxílio do governo do Estado, por meio deste programa de Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares é de grande importância para o município. Este projeto visa priorizar a manutenção da trafegabilidade em trechos críticos, contribuir para que os produtores rurais tenham transporte seguro de insumos e safras agrícolas, estimulando a produção, principalmente a agricultura familiar, contribuir para que as comunidades rurais (Restinga Seca, Castelhanos de Fora, Porto Velho e Morro do Cristo) possam ter atendimento às suas necessidades básicas, especialmente no que se refere à saúde, transporte escolar, lazer e abastecimento.


José Brasílio Scheremeta Ltda
Engenheiro Civil
CREA PR - 89139/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Rua Guilherme Schiffer, 67 – Fone/Fax (42) 3256-1122
CEP 84.140-000 Porto Amazonas – PR
E-mail: prefpamazonas@uol.com.br



5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	4
2 - Número de agricultores	30

Nome das Comunidades atendidas: Porto Velho, Restinga Seca, Castelhanos de Fora e Morro do Cristo.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
9	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada


José Basílio Scheremeta Lino
Engenheiro Civil
CREA PR - 89139/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Rua Guilherme Schiffer, 67 – Fone/Fax (42) 3256-1122
CEP 84.140-000 Porto Amazonas – PR
E-mail: prefpamazonas@uol.com.br




7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases / Serviços	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Serviços preliminares – Placas de Obra (4 unidades 1,50x2,00m, total de 12,00m ²)	R\$ 2.482,20		R\$ 2.482,50
5	Terraplenagem: escarificação e remoção de revestimento primário (e=5cm, 1.200m ³)	R\$ 4.284,00		R\$ 4.284,00
6	Regularização e compactação do subleito (24.000m ²)	R\$ 74.880,00		R\$ 74.880,00
7	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro (24.000,00m ²)	R\$ 379.413,80		R\$ 379.413,80
8	Colchão de argilo para pavimento poliédrico (24.000,00m ²)	R\$ 42.720,00		R\$ 42.720,00
9	Enchimento com argila para pavimento poliédrico (24.000,00m ²)	R\$ 17.784,00		R\$ 17.784,00
10	Compactação de pavimentação poliédrica	R\$ 8.436,00		R\$ 8.436,00
11	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de cordão lateral p/ pav. poliédrico (8.000,00m)	R\$ 60.240,00		R\$ 60.240,00
12	Contenção lateral com solo local (8.000,00m ²)	R\$ 9.760,00		R\$ 9.760,00
	Total	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	15/10/2013	15/11/2013
Contratação	16/11/2013	20/12/2014
Fiscalização	16/11/2013	20/12/2014


José Brasilio Scheremeta Lino
Engenheiro Civil
CREA PR - 89159/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Rua Guilherme Schiffer, 67 – Fone/Fax (42) 3256-1122
CEP 84.140-000 Porto Amazonas – PR
E-mail: prefpamazonas@uol.com.br



Trecho 01	16/11/2013	28/02/2014
Trecho 02	01/03/2013	25/04/2014
Trecho 03	26/04/2014	31/08/2014
Trecho 04	1º/09/2014	20/12/2014


- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 150.00,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	JOSÉ BRÁSILIO SCHEREMETA LINO	 José Brásilio Scheremeta Lino Engenheiro Civil CREA PR - 89159/D Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR-89.159/D	
Local:	Porto Amazonas/PR	
Data:	19/09/2013	




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Rua Guilherme Schiffer, 67 – Fone/Fax (42) 3256-1122
CEP 84.140-000 Porto Amazonas – PR
E-mail: prefpamazonas@uol.com.br




11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	ADEMIR SCHÜHLI	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	150.279.969-34	
Local:	Porto Amazonas/PR	
Data:	19/09/2013	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

APROVAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES - 2013, DA SEAB, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Laertes Sidney Bianchessi Chefe do Núcleo Regional SEAB / Ponta Grossa Assinatura
Nome:	LAERTES SIDNEY BIANCHESSI	
CPF:	323.046.769-87	
Local:	PONTA GROSSA - PR	
Data:	24/09/13 *	

Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Claudio Marques Bittencourt Eng. Fiscal - SEAB IDENT. 22417-D M.R. Ponta Grossa Assinatura
Nome:	CLAUDIO M. BITTENCOURT	
CPF:	532.863.089-00	
Local:	PONTA GROSSA	
Data:	24/09/2013	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Rua Guilherme Schiffer, 67 – Fone/Fax (42) 3256-1122

CEP 84.140-000 Porto Amazonas – PR

E-mail: prefpamazonas@uol.com.br

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES



MEMORIAL DESCRITIVO

Locais/Comunidades: Morro do Cristo, Porto Velho,
Restinga Seca e Castelhanos de Fora

Porto Amazonas
2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Rua Guilherme Schiffer, 67 – Fone/Fax (42) 3256-1122

CEP 84.140-000 Porto Amazonas – PR

E-mail: prefpamazonas@uol.com.br



MEMORIAL DESCRITIVO

Para obra de **Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares**, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, extração, carga, transporte e assentamento de poliedro e execução de contenção lateral etc.

Locais: trechos de estradas rurais nas comunidades Morro do Cristo, Porto Velho, Restinga Seca e Castelhanos de Fora.

Extensão Total / Área Total: 4.000,00m / 24.000,00m²

Justificativa do Projeto

Refere-se aos serviços de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e contenção lateral em pedra, a serem executados nas vias rurais do município de Porto Amazonas, descritas a seguir. A pavimentação poliédrica das estradas rurais com pedras irregulares mostra-se uma solução viável do ponto de vista econômico, além de proporcionar boa trafegabilidade. Este projeto visa priorizar a manutenção da trafegabilidade em trechos críticos, contribuir para que os produtores rurais tenham transporte seguro de insumos e safras agrícolas, estimulando a produção, principalmente a agricultura familiar, contribuir para que as comunidades rurais (Restinga Seca, Castelhanos de Fora, Porto Velho e Morro do Cristo) possam ter atendimento às suas necessidades básicas, especialmente no que se refere à saúde, transporte escolar, lazer e abastecimento.

Locais

Trecho 1: Morro do Cristo

Extensão: 1.100,00m

Largura: 6,00m

Área a ser pavimentada: 6.600,00m²

Trecho 2: Porto Velho

Extensão: 600,00m

Largura: 6,00m

Área a ser pavimentada: 3.600,00m²

Trecho 3: Castelhanos de Fora

Extensão: 1.200,00m

Largura: 6,00m

Área a ser pavimentada: 7.200,00m²


José Brasílio Scheremeta Lins
Engenheiro Civil
CREA PR - 891597/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Rua Guilherme Schiffer, 67 – Fone/Fax (42) 3256-1122

CEP 84.140-000 Porto Amazonas – PR

E-mail: prefpamazonas@uol.com.br

Trecho 4: Restinga Seca

Extensão: 1.100,00m

Largura: 6,00m

Área a ser pavimentada: 6.600,00m²



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Serviços Preliminares

Placa de Obra:

Em cada trecho a receber as obras de pavimentação poliédrica com pedras irregulares será implantada uma placa de obra, de forma retangular, medindo 2,00x1,50m, em chapa de aço galvanizada, contendo as informações do programa, dos entes envolvidos e valores. Este serviço totaliza 4 unidades, medindo 12,00m².

Terraplenagem

Escarificação e remoção de revestimento primário

A fim de se possibilitar a adequação/conformação do greide, será executado o serviço de escarificação e remoção de revestimento primário, em camada de 5cm de espessura, com equipamento motoniveladora, efetuando o nivelamento das vias. O material removido será disposto nas laterais da via e servirá de material para execução do serviço de contenção lateral com solo. O serviço totaliza 1.200,00m³.


Pavimentação

Regularização e compactação do subleito

A empresa contratada realizará a compactação do subleito com o equipamento rolo compactador, garantindo a consistência/resistência mínima do solo, para tráfego médio de veículos (cargas até 10t por eixo ou veículo padrão de 36t). O serviço é medido em metro quadrado, totalizando 32.000,00m².

Colchão de argila para pavimento poliédrico

Após a regularização e compactação do subleito, o trecho a ser pavimentado receberá, em toda a extensão e largura, material para colchão de argila (sobre o qual as pedras serão assentadas). O serviço é medido em metro quadrado e totaliza 24.000,00m².


José Basílio Scheremeta Ltda
Engenheiro Civil
CREA PR - 89159/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Rua Guilherme Schiffer, 67 – Fone/Fax (42) 3256-1122

CEP 84.140-000 Porto Amazonas – PR

E-mail: prefpamazonas@uol.com.br



Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro

Ficará sob responsabilidade da empresa contratada a extração, o transporte (desde a pedreira até o trecho), o preparo e o assentamento das pedras irregulares (poliedros). O serviço deverá obedecer às normas do DER/PR, assentando as pedras sobre colchão de argila, perfeitamente compactada. As pedras deverão ter uma face reta (aquela sobre a qual os veículos trafegarão). O serviço será medido em metro quadrado, totalizando 22.800,00m².

Enchimento (rejuntaemento) com argila para pavimento poliédrico

Deverão ser preenchidos todos os vãos entre as pedras assentadas, com material argila, fazendo-se o rejuntaemento. O serviço é medido em metro quadrado, será executado em toda a área, totalizando 22.800,00m².

Compactação de pavimentação poliédrica


A compactação do pavimento será executada com rolo compactador liso, de forma a garantir a conformidade (nivelamento) das pedras, em toda a extensão, de forma a garantir os parâmetros de qualidade conforme normas técnicas do DER/PR. O serviço é medido em metro quadrado, totalizando 22.800,00m².

Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de cordão lateral para pavimento poliédrico

Ficará sob responsabilidade da empresa contratada a extração, o transporte (desde a pedreira até o trecho), o preparo e o assentamento das pedras poliédricas (fincadas em pedra), de forma a contenção lateral do pavimento de ambos os lados da via. As pedras deverão ter as faces retas. O serviço será medido em metro linear, totalizando 8.000,00m.

Contenção lateral com solo local

Deverá ser executado, junto às fincadas de pedra (cordão lateral), um aterro compactado em faixa com 1,00m de largura, de modo a garantir o posicionamento do cordão lateral de pedras. O material utilizado é aquele resultante da escarificação e remoção de revestimento primário. O serviço é medido em metro quadrado, totalizando 8.000,00m².


José Brasílio Scheremeta Lino
Engenheiro Civil
CREA PR - 89159/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Rua Guilherme Schiffer, 67 – Fone/Fax (42) 3256-1122

CEP 84.140-000 Porto Amazonas – PR

E-mail: prefpamazonas@uol.com.br

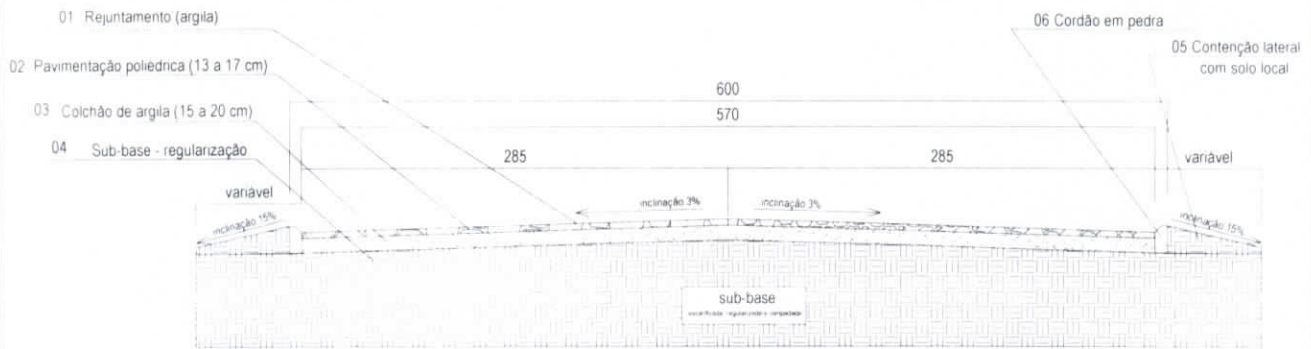


SERVIÇOS FINAIS

O prazo de execução previsto para a realização da obra é de 12 (doze meses), a contar da data de contratação da empresa. O pagamento será efetuado trimestralmente, em 4 (quatro) parcelas de R\$ 150.000,00; e o custo total do projeto é de R\$ 600.000,00. A obra deverá ser entregue após testes que garantam a qualidade e operacionalidade (funcionamento), limpa, livre de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos necessários que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por má execução.

Porto Amazonas, 19 de setembro de 2013

José Brasília Scheremeta Lino
Eng. Civil CREA PR-89.159/D



SEÇÃO TRANSVERSAL

ESCALA 1 : 50



CÁLCULO DE ÁREAS E VOLUMES DOS 4 KM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

Ítem	Camada	Tipo	Espessura (cm)	Largura (m)	Comprim. (m)	Área (m ²)	Volume (m ³)
01	Rejuntamento (travamento)	Argila	5	5,70	4.000,00	22.800,00	1.140,00
02	Pavimentação poliédrica	Pedra Tosca	15 (média)	5,70	4.000,00	22.800,00	3.508,00 (6,5 m ³ /m ²)
03	Colchão de argila	Argila	20	6,00	4.000,00	24.000,00	4.800,00
04	Regularização subleito	Subleito	-	8,00	4.000,00	32.000,00	-
05	Contenção pavimento	Cordão de Pedra	-	-	8.000,00	-	-
06	Contenção lateral c/ eleivam.	Solo	-	1,00 x 2	4.000,00	8.000,00	-



PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SETOR DE PROJETOS

Rua Guilherme Schiffer, 67, centro, 84 140-000, Porto Amazonas-Pr - CNPJ 76.179.837/0001-01

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA/ENDEREÇO

ESTRADA RURAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS

FINALIDADE

TRECHO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR

PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR SCHÜHLI - PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

José Brasílio S. Lino

JOSÉ BRASÍLIO S. LINO - ENG.º CIVIL - CREA PR-89 159/D

CONTEUDO

SEÇÃO TRANSVERSAL
 TABELA DE CÁLCULO DE ÁREAS E VOLUMES

DATA

SETEMBRO / 2013

ESCALA

SEM ESCALA

DESENHO

J B S L

PRANCHA

ÚNICA



SEÇÃO TRANSVERSAL

SEM ESCALA

Jose
Jose Brasílio Scheremeta Lino
 Engenheiro Civil
 CREA PR - 89159/D





PLANILHA ORÇAMENTARIA

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

ORÇAMENTO GLOBAL

Município: PORTO AMAZONAS

Locais/comunidades: Morro do Cristo, Restinga Seca, Castelhanos de Fora e Porto Velho

Serviços: Serviços Preliminares / Terraplenagem / Pavimentação Poliédrica (pedras irregulares)

Extensão / Área Total: 4.000,00m / 24.000,00m²

Data: SETEMBRO/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa da Obra (modelo obras do Governo Estadual) 1.50x2.00m	m²	12,00	206,85	2.482,20
SUB TOTAL 1					2.482,20
TERRAPLENAGEM					
2.1	Escarificação e remoção de revestimento primário (e=5cm)	m³	1.200,00	3,57	4.284,00
SUB TOTAL 2					4.284,00
PAVIMENTAÇÃO					
3.1	Regularização e Compactação do Subleito	m²	32.000,00	2,34	74.880,00
3.2	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	m²	22.800,00	16,64	379.413,80
3.3	Colchão de argila para pavimento poliedrico	m²	24.000,00	1,78	42.720,00
3.4	Enchimento com argila para pavimento poliedrico	m²	22.800,00	0,78	17.784,00
3.5	Compactação de pavimentação poliedrica	m²	22.800,00	0,37	8.436,00
3.6	Extração, carga, transporte, assentamento de cordão lateral p/ pav. poliedrico	m	8.000,00	7,53	60.240,00
3.7	Contenção lateral com solo local	m²	8.000,00	1,22	9.760,00
SUB TOTAL 3					593.233,80
TOTAL GERAL					600.000,00


 José Brasílio Scheremeta Lino
 Eng. Civil CREA-PR 89.1159/D


 Ademir Schühli
 Prefeito Municipal





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20133821953
Vínculo Empregatício com Empresa
Pública
ART Principal



Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: JOSE BRASÍLIO SCHEREMETA LINO (CPF:051.765.159-97)
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.
Empresa contratada:

Nº Carteira: PR-89159/D
Nº Visto Crea: -
Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

CPF/CNPJ:
76.179.837/0001-01

Endereço: RUA GUILHERME SCHIFFER 67 CENTRO
CEP: 84140000 PORTO AMAZONAS PR Fone: (42) 3256-1122

Local da Obra: ESTRADAS RURAIS - MORRO DO CRISTO, RESTINGA SECA, PORTO VELHO E
CASTELHANOS DE FORA 0

Quadra: Lote:

MORRO DO CRISTO E OUTROS - PORTO AMAZONAS PR

CEP: 84140000

Tipo de Contrato	5	VÍNCULO EMPREGATÍCIO	Dimensão	24000 M2
Ativ. Técnica	19	PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO		
Área de Comp.	1100	SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL		
Tipo Obra/Serv	046	OUTROS (TRANSPORTES)		
Serviços contratados	018	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		
	035	PROJETO		
	130	OUTROS		
	301	VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO PÚBLICO	Dados Compl.	0

Guia N

ART Nº
20133821953

Data Início 19/09/2013
Data Conclusão 20/12/2014

Vlr Taxa R\$ 50,00 Entidade de Classe 0

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM TRECHOS DE ESTRADAS RURAIS DO
MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS, COM ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA DE 24.000,00M2, NAS
COMUNIDADES PORTO VELHO, RESTINGA SECA, CASTELHANOS DE FORA E MORRO DO CRISTO, NO VALOR
TOTAL DE R\$ 600.000,00

Insp.: 4710
24/09/2013
CreaWeb 1.08


Assinatura do Contratante


Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.
Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CMA CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná [telefone (41) 3350-6727], e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos".

Contratante/Proprietário

Profissional Responsável

Para a adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovConta Caixa



Nome:	PREF MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
Conta Debitada:	0397/006/00000070-0

Bloqueto - Dados do Pagamento

Representação Numérica do Código de Barras:

1049081290	43010200244	01338219536	5	58410000005000
------------	-------------	-------------	---	----------------

Data do Vencimento:	04/10/2013
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	50,00
Identificação da Operação:	ART20133821953

Data de Débito:	24/09/2013
Data da Operação:	24/09/2013
Código da Operação:	00262792
Chave de Segurança:	FN8HCRNZCMZMLLYL

CPFs Autorizadores:

018.094.989-61

150.279.969-34

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

Ask



Profissional: JOSE BRASILIO SCHEREMETA LINO
 Guia referente à ART 20133821953
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

CAIXA	10490.81290 43010.200244 01338.219536 5 58410000005000		
Agência/Código Cedente	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
0373/081294-3	24010002013382195-3	04/10/2013	R\$ 50,00

Autenticação Mecânica

CAIXA 104-0 | 10490.81290 43010.200244 01338.219536 5 58410000005000

Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA					Vencimento 04/10/2013
Cedente CREA-PR (76.639.384/0001-59)				(creaw ebart)	Agência/Código Cedente 0373/081294-3
Data do Doc. 24/09/2013	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Process. 24/09/2013	Nosso Número 24010002013382195-3
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Qtde. da Moeda	Valor da Moeda X	(=) Valor do Documento R\$ 50,00
INSTRUÇÕES Guia referente a ART Nro. 20133821953 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Sacado JOSE BRASILIO SCHEREMETA LINO					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado R\$ 50,00

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

