

PROGRAMA DE APOIO COM ÓLEO DIESEL

ANEXO 1 – RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL – RVI

1. MUNICÍPIO:- Jardim Olinda (PR)



2. **CONDIÇÕES DA ESTRADA:-** Estradas Rurais demarcada em coloração azul e amarela, Sem ser readequadas anteriormente, necessitando de melhorias em toda a sua extensão, que consiste em readequar, construir lombadas e de sangradouros (bigodes), remoção de camada vegetal nas laterais da estrada, controle de erosão laminar e sulcos, reposição de solo, abaulamento do leito e construção de caixas de retenção, visando principalmente a Recuperação da Trafegabilidade com as mudanças climáticas naturais.



3. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DOS TRECHOS:

ESTRADA DA ESCOLINHA:

Coordenada inicial $-N(m) = 392927.72$ $E(m) = 7504951.12$

Coordenada final $-N(m) = 395836.61$ $E(m) = 7498563.25$

Comprimento: 7.500 metros

ESTRADA ASSENTAMENTO MÃE DE DEUS:

Coordenada inicial $-N(m) = 389603.84$ $E(m) = 7500269.84$

Coordenada final $-N(m) = 383039.40$ $E(m) = 7504852.32$

Comprimento: 10.600 metros

Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 06 metros, final 08 metros.

- 4. CONDIÇÕES DA ESTRADA:-** Estrada Rural demarcada em coloração violeta, Sem ser readequadas anteriormente, necessitando de melhorias em toda a sua extensão, que consiste em readequar, construir lombadas e de sangradouros (bigodes), remoção de camada vegetal nas laterais da estrada, controle de erosão laminar e sulcos, reposição de solo, abaulamento do leito e construção de caixas de retenção, visando principalmente a Recuperação da Trafegabilidade com as mudanças climáticas naturais.

5. TRECHOS:

5.1 – ESTRADA ESCOLINHA:

Coordenada Inicial (UTM) 22k-392927.72/ E 7504951.12 m	Coordenada Final (UTM) 22k-395836.61/E 7498563.25 m	Comprimento Total (7.5KM) 7.500 metros	Largura Atual 05 metros	Largura Final 08 metros
--	---	--	-------------------------	-------------------------



5.2-ESTRADA ASSENTAMENTO MÃE DE DEUS:

Coordenada Inicial (UTM) 22k-389603.84/ E 7500269.87 m	Coordenada Final (UTM) 22k-383039.40/E 7504852.32 m	Comprimento Total (10.6KM) 10.600 metros	Largura Atual 05 metros	Largura Final 08 metros
--	---	--	-------------------------	-------------------------



() Estradas Rurais adequadas e/ou readequadas e/ou melhoradas com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;

() Estradas Rurais com segmentos críticos, que não permitem o tráfego contínuo todos os meses do ano;

(x) Estradas Rurais implantadas, razoavelmente conservadas, necessitando de práticas adequadas de conservação para que ocorra o tráfego contínuo em todos os meses do ano.



6. SOLUÇÕES TÉCNICAS PROPOSTAS PARA RECUPERAÇÃO:

6.1 – ESTRADA ESCOLINHA:

Item	Detalhe	Unidade de medida	Quantidade	Hora Maquina	Óleo Diesel	Tipo de maquina
1	Lombadas	Um/hm/lt	16	21	316	Pá carregadeira
2	Sangradouros (bigodes/caixas)	Um/hm/lt	76	52	975	Retro escavadeira
3	Abaulamento do Leito/correção	Mts/hm/lt	7.500 m	131	2.275	Pá carregadeira
4	Cascalhamento DMT 3.750 metros Perímetro cascalhado: 783 metros	Mts/hm/lt	783 m	19.5 10.7 1.283 km	291 234 427	Pá carregadeira, moto niveladora caminhão Basculante
5	TOTAL				4.518 litros	

TOTAL DO TRECHO: 7.500 metros

OBS: (Recuperação do leito, lombadas, bigodes, caixas de retenção e abaulamento do leito da estrada).

OBS: Datum WGS84



6.2- ESTRADA ASSENTAMENTO MÃE DE DEUS:


Item	Detalhe	Unidade de medida	Quantidade	Hora Maquina	Óleo Diesel	Tipo de maquina
1	Lombadas	Um/hm/lt	23	30	451	Pá carregadeira
2	Sangradouros (bigodes/caixas)	Um/hm/lt	107	73	1.369	Retro escavadeira
3	Abaulamento do Leito/correção	Mts/hm/lt	7.500 m	185	3.212	Pá carregadeira
4	Cascalhamento DMT 5.300 metros Perímetro cascalhado: 810 metros	Mts/hm/lt	810 m	19.7 11.5 1.280 km	298 251 427	Pá carregadeira, Moto niveladora Caminhão Basculante
5	TOTAL				6.008 litros	

TOTAL DO TRECHO: 10.600 metros

OBS: (Recuperação do leito, lombadas, bigodes, caixas de retenção e abaulamento do leito da estrada).

OBS: Datum WGS84

7 - INFORMAÇÕES DE LOCALIZAÇÃO QUANTO A JAZIDA DE CASCALHO A SER EXTRAÍDO:

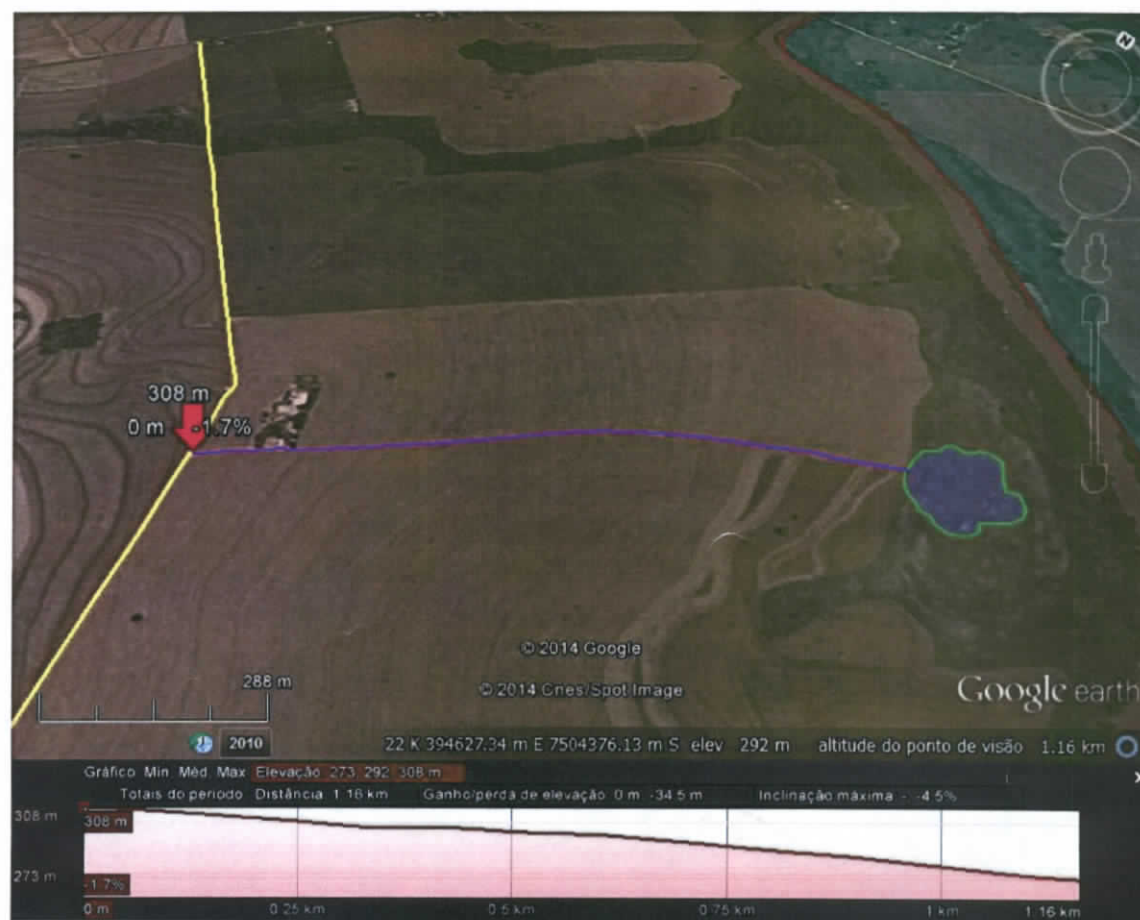

Coordenada Inicial: 22K 394195.82m E 7503885.05 m

Coordenada Final: 22K 395158.64 m E 7504502.76 m

Elevação: 273 metros.

OBS: Jazida de cascalho localizada dentro do perímetro urbano de Jardim Olinda - PR, com quilometragem média correspondente a 1.16 km para extração, até o local de recuperação da estrada rural para a melhoria da trafegabilidade da mesma.

EDUARDO VINICIOS LIBANORI

TEC. EM AGROPECUÁRIA EMATER-PR

CPF 096.166.958-00 – CREA 4485/TD

Eduardo Venício Libanori
Téc. em Agropecuária
CPF 096.166.958-60
CREA 4485/TD
EMATER

Eduardo Venício Libanori
Téc. em Agropecuária
CPF 096.166.958-60
CREA 4485/TD
EMATER

Alberto Carlos Moris

Alberto Carlos Moris
Engenheiro Agrônomo
CREA n.º 3995-D
