



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: Ribeirão do Pinhal			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Ribeirão do Pinhal		CNPJ: 76.968.064/0001-42	
Endereço: Rua Paraná 983			
UF: PR	CEP: 86.490-000	Telefone: (43)3551-8300	
Conta Corrente: nº 20.197-9	Banco: Brasil	Agência: 0652-1	Praça de Pagamento: Centro
Responsável: Dartagnan Calixto Fraiz			CPF: 171.895.279-15
CI/Órgão Expedidor: 773.261-9 SESP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Executivo	
2 OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 7,3 quilômetros, no Trecho Estrada ITAPEMIRIM.

3. JUSTIFICATIVA:

O Município de Ribeirão do Pinhal encontra-se com suas estradas Rurais em má condição de conservação, causada pelo excesso de chuva nesses últimos meses o que tem dificultado a trafegabilidade de veículos para o escoamento da safra, transporte de alunos e o deslocamento dos próprios moradores rurais a sede do Município.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	131

Comunidades atendidas: SERTÃOZINHO, ITAPEMIRIM, AGUA DA LIMEIRA, SÃO FANCISCO.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$ litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 9.983 litros de óleo diesel	R\$ 2,567	R\$ 25.626,37	R\$ 1.626,36	24.000,00	18 meses após a publicação do DOE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -



6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Lombadas	UM	28	Pá Carregadeira	21h
2	Bigodes	UM	26	Pá Carregadeira	20h
3	Caixas de retenção	UM	15	Pá Carregadeira	12h
4	Regularização/abaulamento	M2	36.500	Motoniveladora	40h
5	Desagregação/Carregamento	M³	5475	Pá Carregadeira	110h
6	Transporte cascalho	M³	5475	Caminhão Basculante	635h
7	Distribuição de cascalho	M²	36.500	Motoniveladora	40h
8	Compactação de cascalho	M²	36.500	Rolo Compactador	28h

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços	X	X	X	X	X	
3	Prestação de Contas						X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais
- Proprietários rurais que margeiam a estrada se comprometem a não prejudicar o trabalho executado, preservando os carregadores para que não haja escoamento de água no leito da estrada a ser trabalhada.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Paulo César Dal Piccolo	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA 17.721-D 7ª Região	
Local:	Ribeirão do Pinhal	
Data:	18/03/2014	




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	171.985.279-15	
Local:	Ribeirão do Pinhal	
Data:	18/03/2014	
		Assinatura

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

O referido projeto trará melhoria no escoamento da produção agrícola, bem como melhoria no transporte escolar e deslocamento da população. Diante disso somos favoráveis.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Maurício Reis Koch Chefe do Núcleo Regional da SEAB Cornélio Procópio - Paraná Assinatura
Nome:	MAURICIO REIS KOCH	
CPF:	584.705.659-35	
Local:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DE CORNELIO PROCÓPIO	
Data:	11/04/14	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Claudio Roberto R. Marques Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16.985-D SEAB/DEAGRO
Nome:	CLAUDIO ROBERTO R. MARQUES	
CPF:	401.995.849-15	
Local:	C. Procópio	
Data:	10/04/2014	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

Anexo 1

RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL - RVI

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL.

TRECHO 1: ITAPEMIRIM

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

() Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;

(X) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;

() Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

Coordenada inicial – UTM: 0560208 e y7415918

Coordenada final – UTM: 0556628 e y 741780

Comprimento: 7,3 km

Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 4 metros, final 5 metros

3. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Bigodes/sangradouros		X	un	26	Pá carregadeira	20
2	Lombadas		X	un	28	Pá carregadeira	21
3	Regularização do leito	-	-	km	7,3	Moto niveladora	40
4	Caixas de retenção	X		un	15	Pá carregadeira	12

* Especificar com um X nas colunas seguintes se é construção (C) ou Manutenção (M). Em caso de realização das duas ações, inserir nova linha para especificar a quantidade de cada uma.

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TRECHO:

Comprimento: 7.300m.

Largura: 5m

Espessura: 0,12m. compactado e 0,15m. bruto

Coordenada de localização inicial – UTM: 0560208 y7415918

Coordenada de localização final – UTM: 0556628 y 741780

Cascalheira liberada IAP:0558433 y 7417482

Qualidade do Material: bom

DMT por trecho: 5,75

1	Corte de cascalho + carregamento	X	M ³	5475	Pá Carregadeira	110
2	Distribuição do cascalho		M ²	36500	Moto Niveladora	40
3	Compactação do cascalho		M ²	36500	Rolo Compactador	28
4	Transporte do cascalho		M ³	5475	Caminhão Basculante	635

5. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE DRENAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO:☒ Bueiros de 0 0,30 m – ☒ tubos☒ Bueiros de 0 0,40 m – ☒ tubos☒ Bueiros de 0 0,60 m – ☒ tubos☒ Bueiros de 0 0,80 m – ☒ tubos

6. RELAÇÃO DE MATERIAL E PONTOS DE LOCALIZAÇÃO (somente em caso de bueiros ou valas laterais com pavimentação)

Ponto	Localização	Unidade	Quantidade	Material	Coordenadas	

7. Serviços Complementares, relatar se necessário:

8. Mapa de Localização do Trecho (anexar):

Data: 18/03/2014

Técnico Responsável:

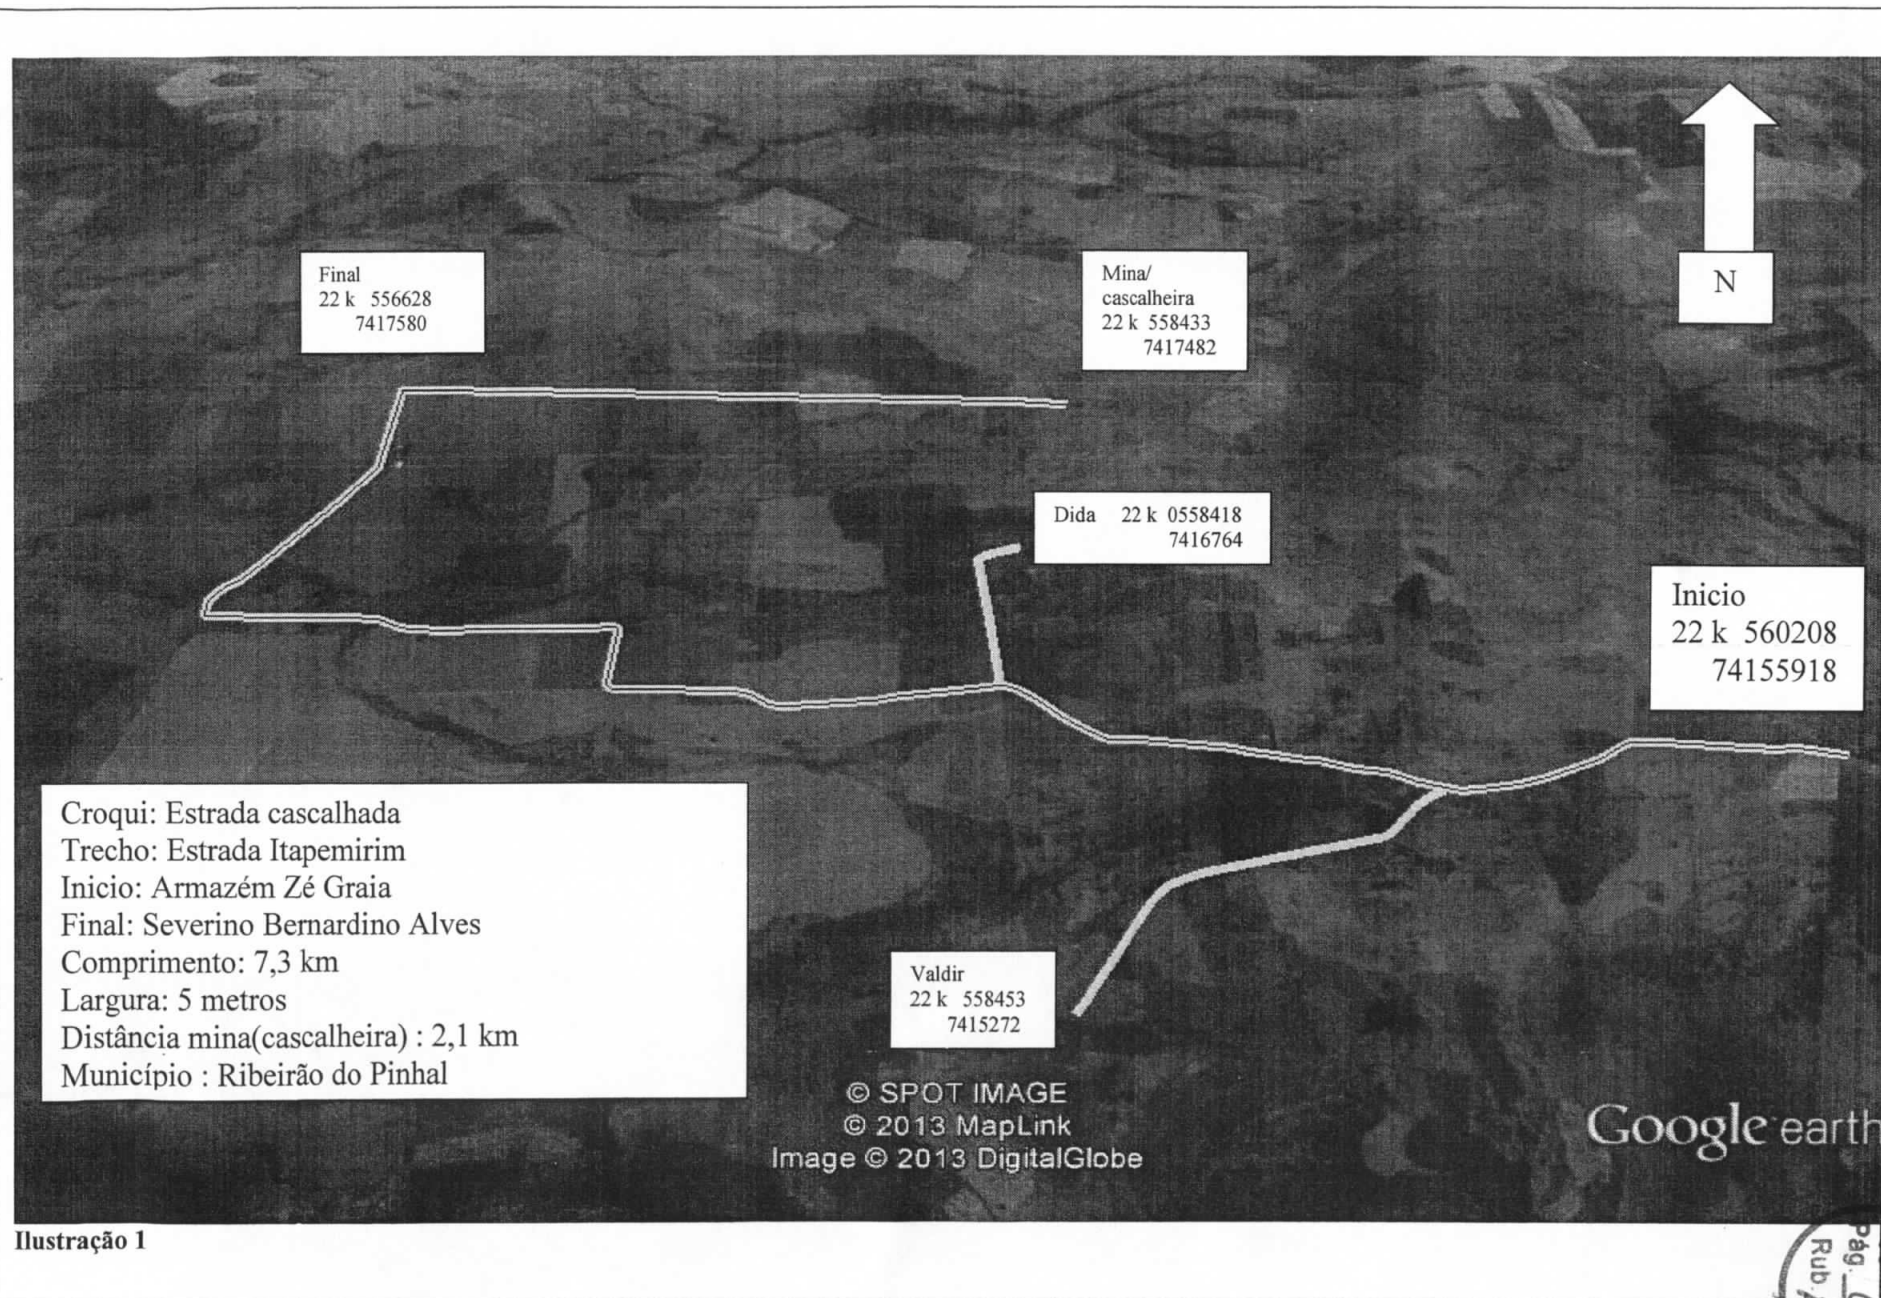
Paulo César Dal Piccolo

Engenheiro Técnico CREA: 17.721-D

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura):



Eng. Agr. Kleber Geraldo Vieira
RG M - 2.853.893
CPF 528.557.676-87
Gerente Regional



SEAB/PTG
CORNELIO
pág. 05
Rub. AL
